

県営農道整備事業


資料 3-6

佐久南部地区 (佐久市・佐久穂町・小海町)


課名：農地整備課

全体計画			前年度までの実績		平成30年度計画 上段[]書きは前年度からの繰越額を外数で示す		31年度以降 残事業費	説明
事業内容	工期	事業費	事業費	事業内容	事業費 予算			
【1期】 農道工 L=2,800m W=6.0(10.0)m	H11~H20	22億5,600万円	22億5,600万円	—	—	—	佐久市から小海町の千曲川左岸地域を南北に縦断する基幹農道を新設し、農産物輸送の効率化及び地域交通網の利便性向上を図る。 臼田区間を除く佐久市～国道299号の間 5.4kmは、地域自主戦略交付金等により実施し、平成24年度末に供用開始となった。 また、地元要望が強く、緊急性の高い『臼田～佐久穂区間』及び『小海区間』は、平成23年度から道整備交付金を活用して実施しており、臼田～佐久穂区間は平成27年度末に完成し、小海工区は平成29年9月に供用開始となった。 平成30年度に付帯工を実施し、事業完了を目指す。	
【3期】 農道工 L=2,630m W=6.0(10.0)m	H15~H24	16億2,700万円	16億2,700万円	—	—	—		
【2期】道整備交付金 農道工 L=5,024m W=6.0(7.0)m	H23~H27	31億円	31億円	—	—	—		
【2期】道整備交付金 農道工 L=400m W=6.0(7.0)m	H28~H30	3億円	2億8,000万円	付帯工 1式	2,000万円	—		

【1期、3期】・・・補助事業としての農道整備事業、農山漁村地域整備交付金、地域自主戦略交付金を活用、 【2期】・・・道整備交付金を活用

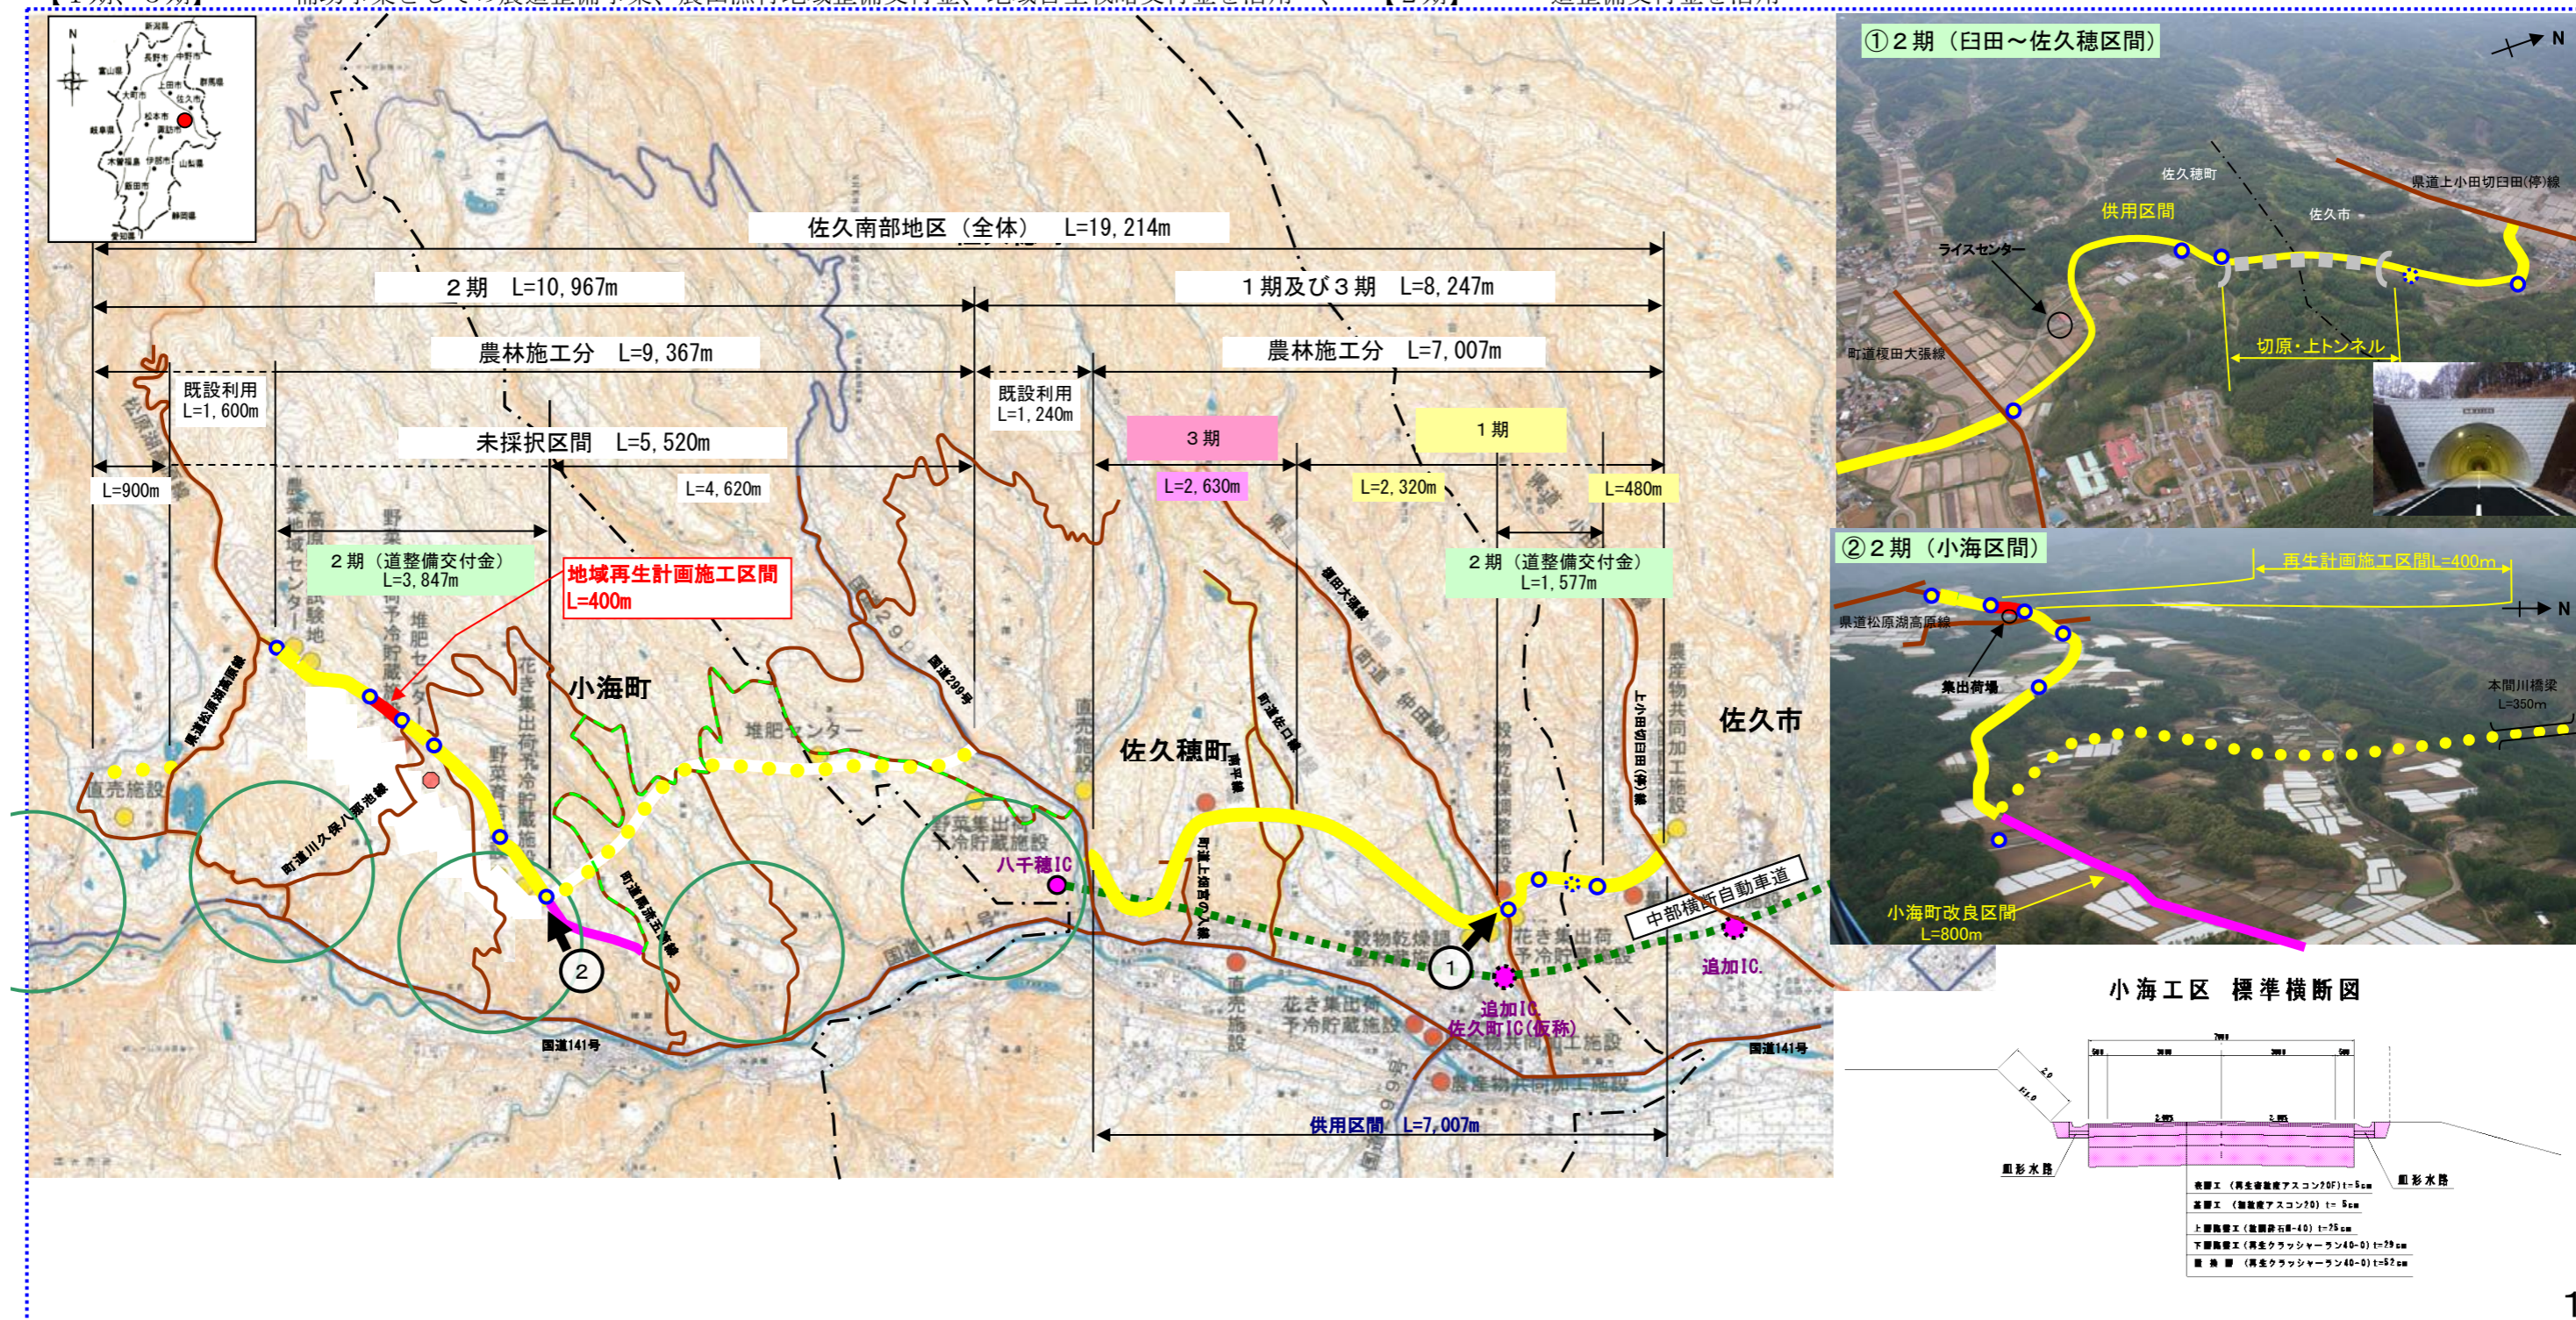

小海町 区間

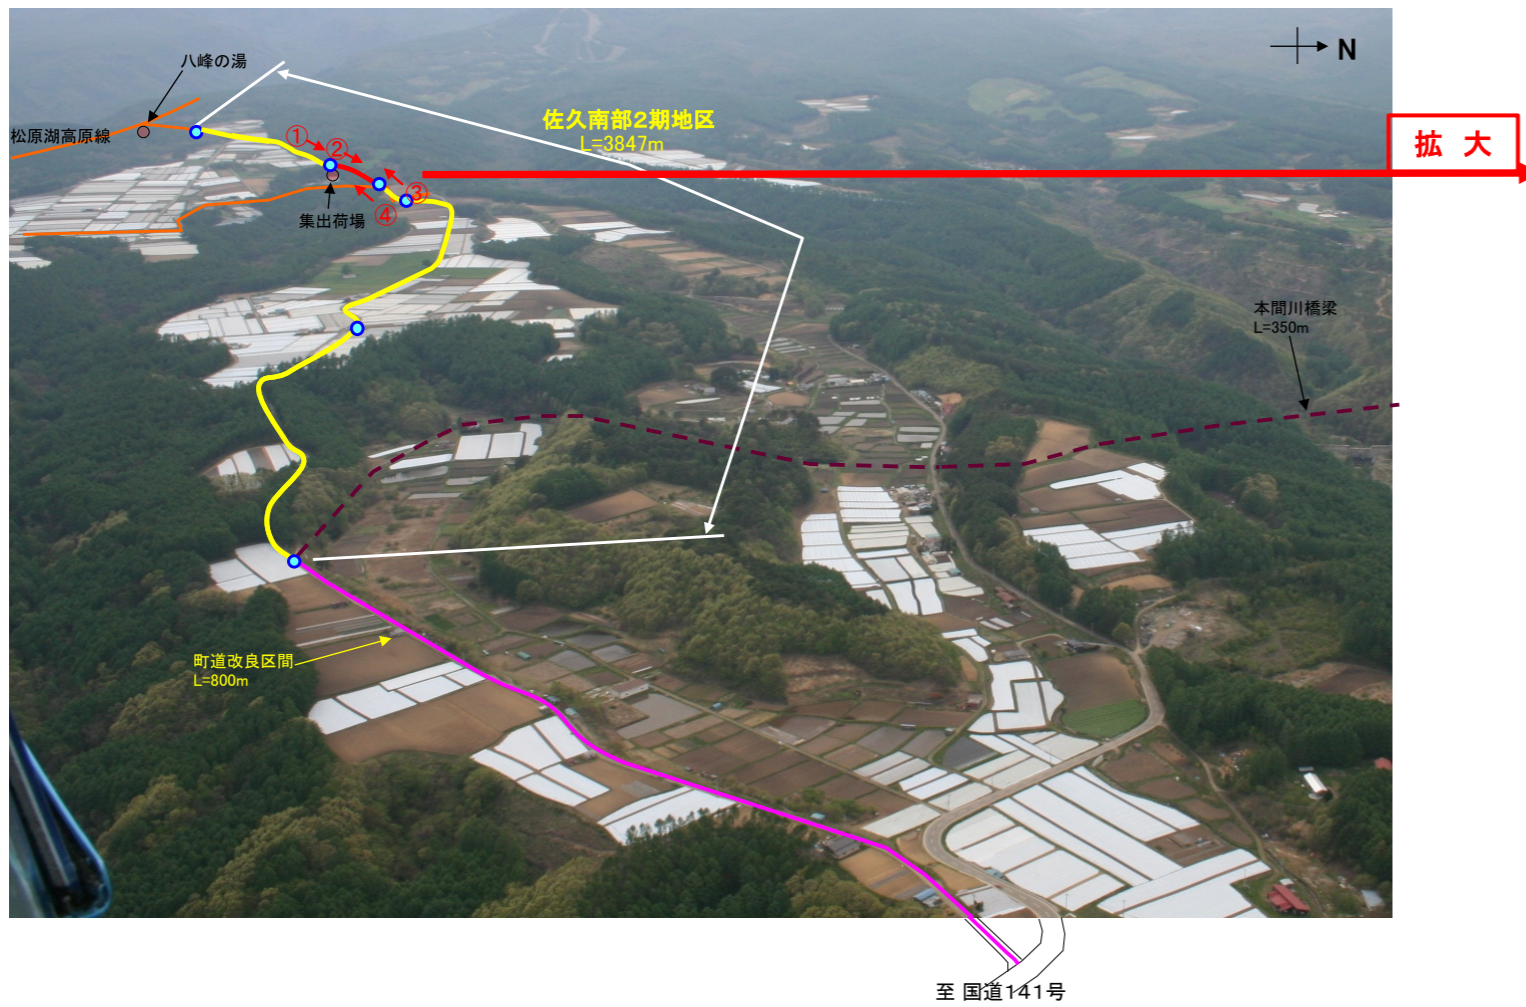

施工箇所



①完成状況



②完成状況



③完成状況



④完成状況

